

2023年乡村振兴水利工程项目 绩效评价报告

主管部门：交城县水利局

实施单位：交城县水利局

委托单位：交城县财政局

评价机构：吕梁正乾会计师事务所（普通合伙）（公章）

主评人：

郝春元



2024年11月15日

目 录

摘要.....	1
一、项目基本情况.....	4
(一) 项目概况.....	4
(二) 资金投入和使用情况.....	6
(三) 项目绩效目标.....	8
(四) 项目实施情况.....	11
二、绩效评价工作开展情况.....	12
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	12
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价依据.....	14
(三) 绩效评价工作过程.....	16
三、综合评价情况及评价结论.....	17
四、绩效评价指标分析.....	17
(一) 项目决策情况.....	17
(二) 项目过程情况.....	20
(三) 项目产出情况.....	22
(四) 项目效益情况.....	24
(五) 项目政策实施效率及效果分析.....	26
五、项目自评核实及复核结论.....	27
六、项目主要绩效及经验做法.....	29
七、项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析.....	30
八、下一步改进意见及政策建议.....	31
九、绩效评价结果应用建议.....	32
十、报告附件.....	32

摘 要

- 1、项目名称：2023年乡村振兴水利工程项目
- 2、项目单位：交城县水利局
- 3、建设地点：交城县西社镇沙沟村、夏家营镇贾家寨村、水峪贯镇水峪贯村等9村

- 4、计划建设规模及工程内容：

(1) 西社镇沙沟村饮水安全巩固提升：①新建截潜流1座；②新建300m³钢筋混凝土蓄水池1座；③铺设输水De125PE管3144m，De110PE管948m；④新建排气井3座、减压井3座、阀门井1座、砖砌矩形阀井1座；⑤配套水表及阀门420个。项目计划总投资为291.19万元。

(2) 夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造：①铺设输水PE管道17425m，其中De125PE管1609m，De90PE管446m，De63PE管1410m，De50PE管13960m；②新建阀门井172座；③配套入户管De25PE管23800m、智能防水刷卡水表990个。项目计划总投资为394.64万元。

(3) 水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目：①在水峪贯镇鲁沿村新建一座60.48m²砖混结构设备间，安装16t/h净化设备、100g/h次氯酸钠发生器各一套；②在西社镇东社村新建一座60.48m²砖混结构设备间，安装10t/h净化设备、100g/h次氯酸钠发生器各一套；③西社镇大岩头村新建一座46.08m²砖混结构设备间，安装10t/h净化设备、100g/h次氯酸钠发生器各一套；④在水峪贯镇水峪贯村、水峪贯镇西冶村、水峪贯镇岭上、西社镇西社村、西社镇沙沟村、西社镇米

家庄村各安装100g/h次氯酸钠发生器一套。项目计划总投资为225.52万元。

5、项目实施情况：

(1) 西社镇沙沟村饮水安全巩固提升：根据交城县水利局《关于2023年交城县夏家营镇贾家寨村、西社镇沙沟村农村饮水安全工程项目实施方案的批复》（交水字〔2023〕57号）文件批准建设，山西新盛宇建设工程有限公司于2023年9月中标，并于2023年9月22日签订合同，合同金额2,496,543.21元。

建设工程开工时间为2023年9月24日，竣工时间为2024年7月10日，实际投资总额为2,776,312.88元。

(2) 夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造：根据交城县水利局《关于2023年交城县夏家营镇贾家寨村、西社镇沙沟村农村饮水安全工程项目实施方案的批复》（交水字〔2023〕57号）文件批准建设，承峻建设科技（山西）有限公司于2023年9月中标，并于2023年9月22日签订合同，合同金额3,220,000.00元。

建设工程开工时间为2023年9月24日，竣工时间为2023年12月2日，实际投资总额为3,542,712.40元。

(3) 根据交城县水利局《关于2023年交城县水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目实施方案的批复》（交水字〔2023〕83号）文件批准建设，交城县永裕源施工服务队于2023年9月中标施工合同，并于2023年9月28日签订工程承揽合同，合同金额为475,782.33元；山西新净界生态环保科技有限公司于2023年11月中标设备合同，并于2023年11月23日签订设备合同书，合同金额为1,520,000.00元。

建设工程开工时间为2023年9月28日，竣工时间为2023年12月27日。实际投资总额为2,138,381.11元。

6、评价结论：评价工作组按照本项目的绩效评价实施方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析，经综合评价，本项目得分为90.00分，绩效评价等级为“优秀”。

2023年乡村振兴水利工程项目 绩效评价报告

吕梁正乾绩评〔2024〕004号

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

农村饮水安全工程是一项民生工程，直接关系到人民群众的生命健康和生活质量，影响社会稳定和经济发展。从2000年以来根据中央、省、市水利部门要求，由政府主导并通过国家补助、市县配套、群众自筹、社会投资等方式，历经饮水解困、饮水全覆盖、饮水安全巩固提升等几个阶段的高强度建设，交城县饮水安全条件总体上有了较大改善，但局部村庄仍存在水源水质不稳定、供水水量不足、水质不达标、计量设施缺失等问题。

具体情况分别为：1、西社镇沙沟村饮水安全巩固提升工程：沙沟村位于交城县西社镇，目前无固定供水水源，村民饮水依靠租借水井取水，取水方便程度低，供水得不到保障，严重影响了当地的生产和生活；2、夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造工程：贾家寨位于交城县夏家营镇，村内供水管网及来水主管线运行已有30余年，现状管线老化、破损严重，维修维护成本极大，漏水损坏时有发生，村民用水得不到保障，饮水处于不安全状态；3、水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目：水峪贯镇水峪贯村、水峪贯镇西冶村、水峪贯镇鲁沿村、水峪贯镇岭上、西社镇西社村、西社镇东社村、西社镇沙沟村、西社镇大岩头村、西社镇米家庄村菌落总数与总大肠杆菌群含量

超标，群众饮水安全受到威胁，身体健康受到影响。

巩固提升农村饮水安全工程、饮水安全管网改造工程、水质消毒净化项目，是改善农村居民生存生活条件的基本需要，是贯彻落实以人为本，构建和谐社会的必然要求，是全面建设小康社会和社会主义新农村的重要任务，更对实施乡村振兴战略具有重要意义。因此，为保障居民能够获得稳定、安全的饮用水，改善生活质量，推动地区可持续发展，本次工程是十分必要的。

2、项目主要内容及实施期限

根据项目实施方案等文件，项目计划总投资为911.35万元。主要内容及实施期限如下：

2.1 项目主要内容

本项目建设主要包括：

(1) 西社镇沙沟村饮水安全巩固提升：①新建截潜流1座；②新建300m³钢筋混凝土蓄水池1座；③铺设输水De125PE管3144m，De110PE管948m；④新建排气井3座、减压井3座、阀门井1座、砖砌矩形阀井1座；⑤配套水表及阀门420个。计划总投资额为291.19万元。

(2) 夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造：①铺设输水PE管道17425m，其中De125PE管1609m，De90PE管446m，De63PE管1410m，De50PE管13960m；②新建阀门井172座；③配套入户管De25PE管23800m、智能防水刷卡水表990个。计划总投资额为394.64万元。

(3) 水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目：①在水峪贯镇鲁沿村新建一座60.48m²砖混结构设备间，安装16t/h净化设备、100g/h次氯酸钠发生器各一套；②在西社镇东社村新建一座60.48m²砖混结构

设备间，安装10t/h净化设备、100g/h次氯酸钠发生器各一套；③西社镇大岩头村新建一座46.08m²砖混结构设备间，安装10t/h净化设备、100g/h次氯酸钠发生器各一套；④在水峪贯镇水峪贯村、水峪贯镇西冶村、水峪贯镇岭上、西社镇西社村、西社镇沙沟村、西社镇米家庄村各安装100g/h次氯酸钠发生器一套。计划总投资额为225.52万元。

2.2 项目计划实施期限

西社镇沙沟村饮水安全巩固提升项目计划于2023年9月24日开展，2023年12月24日完成；夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造项目计划于2023年9月24日开展，2023年12月22日完成；水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目计划于2023年9月28日开展，2023年12月27日完成。

（二）资金投入和使用情况

1、资金投入情况

截至2024年10月31日，根据交城县财政局下达的项目专项支出预算指标等文件，本次乡村振兴水利工程项目建设资金全部来源于政府投资，全部为财政拨款资金，其中西社镇沙沟村饮水安全巩固提升项目实际到位资金222.00万元，夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造项目实际到位资金344.04万元，水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目实际到位资金207.30万元，共计773.34万元。

2、资金使用情况

（1）截至2024年10月31日，西社镇沙沟村饮水安全巩固提升项目实际到位资金222.00万元，实际支出222.00万元，无结余，预算执行率100%。具体项目支出明细见下表：

单位：万元

项目名称	项目实施单位	内容	金额	时间	收款单位
西社镇沙沟村饮水安全巩固提升项目	交城县水利局	工程款	74.90	2023.09.28	山西新盛宇建设工程有限公司
			97.69	2023.11.29	
			41.83	2023.12.21	
		监理费	2.85	2023.09.28	山西龙腾工程监理有限公司
		勘测设计费	4.73	2023.09.28	山西众泰达工程设计咨询有限公司
		合计	222.00		

(2) 截至2024年10月31日，夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造项目建设资金实际到位资金344.04万元，实际支出344.04万元，无结余，预算执行率100%。具体项目支出明细见下表：

项目名称	项目实施单位	内容	金额	时间	收款单位
夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造项目	交城县水利局	工程款	96.60	2023.09.28	承峻建设科技（山西）有限公司
			88.55	2023.11.28	
			75.07	2023.11.29	
			12.73	2023.12.28	
			37.33	2023.12.28	
			14.20	2024.09.29	
		设计费	11.85	2024.09.29	山西众泰达工程设计咨询有限公司
		审核费	0.87	2024.09.29	山西天信工程项目管理有限公司
		监理费	5.6	2024.09.29	山西龙腾工程监理有限公司

		检测费	1.24	2024.09.29	山西德诺工程检测有限公司
		合计	344.04		

(3) 截至2024年10月31日，水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目建设资金实际到位资金207.30万元，实际支出207.30万元，无结余，预算执行率100%。具体项目支出明细见下表：

项目名称	项目实施单位	内容	金额	时间	收款单位
水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目	交城县水利局	工程款	32.76	2023.11.29	交城县永裕源施工服务队
			15.54	2024.09.29	
		设备款	139.69	2023.12.25	山西新净界环保科技有限公司
			7.75	2024.09.29	
		设计费	3.54	2023.11.29	山西水元素水利工程设计有限公司
			3.54	2024.09.29	
		监理费	2.14	2023.11.29	山西龙腾工程监理有限公司
			2.14	2024.09.29	
		造价咨询费	0.2	2023.11.29	山西晋宇工程造价咨询有限公司
		合计	207.30		

(三) 项目绩效目标

1、项目总体目标

项目的实施，可保障村民用水，保证村内生活居民的饮水安全，对改善当地的自然环境、社会环境和提高群众生活水平起到积极作

用，同时对促进当地经济的建设、实现人民安居乐业有着重要意义。

2、项目阶段性目标

(1) 西社镇沙沟村饮水安全巩固提升项目：新建截潜流1座；新建300m³钢筋混凝土蓄水池1座；铺设输水De125PE管3144m，De110PE管948m；新建排气井3座、减压井3座、阀门井1座、砖砌矩形阀井1座等。计划总投资额为291.19万元，计划完成时间2023年12月24日，项目的实施能够使自来水稳定送到各家各户，提高居民的生活质量，促进环境与经济的可持续发展。群众满意度90%以上。具体效益目标见下表：

序号	指标	项目名称	项目指标/建筑规模	金额（万元）
1	产出	建筑工程	截潜流、300m³蓄水池、输水管道、排气井、减压井、阀门井、砖砌矩形阀井	224.58
2		金属结构设备及安装工程	截潜流、300m³蓄水池、输水管道、排气井、减压井、阀门井、砖砌矩形阀井、入户工程	21.89
3		临时工程	施工道路、房屋建筑工程、临时排水及其他临时工程	12.35
4		独立费用	建设管理费、工程建设监理费、勘测设计费、水质化验费	25.27
5		基本预备费		7.1
合计				291.19

(2) 夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造项目：铺设输水PE管道17425m；新建阀门井172座；配套入户管De25PE管23800m、智能防水刷卡水表990个。计划总投资额为394.64万元，计划完成时间2023年12月22日，项目的实施将提升水质，减少渗漏污染，优化供水调度，节约水资源，提升农村生活品质，促进农村基础设施建设，推动乡村振兴战略实施。群众满意度90%以上。具体效益目标见下表：

序号	指标	项目名称	项目指标/建筑规模	金额（万元）
1	产出	建筑工程	输水管道、圆形预制钢筋混凝土阀井、入户工程	289.19
2		金属结构设备及安装工程	输水管道、入户工程	45.27
3		临时工程	施工临时道路、房屋建筑、施工仓库、工棚、临时排水及其他临时工程	14.49
4		独立费用	建设管理费、监理费、勘测设计费	36.06
5		基本预备费		9.63
合计				394.64

(3) 水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目：在水峪贯镇鲁沿村新建一座60.48m²砖混结构设备间，安装16t/h净化设备、100g/h次氯酸钠发生器各一套；在西社镇东社村新建一座60.48m²砖混结构设备间，安装10t/h净化设备、100g/h次氯酸钠发生器各一套；西社镇大岩头村新建一座46.08m²砖混结构设备间，安装10t/h净化设备、100g/h次氯酸钠发生器各一套；在水峪贯镇水峪贯村、水峪贯镇西冶村、水峪贯镇岭上、西社镇西社村、西社镇沙沟村、西社镇米家庄村各安装100g/h次氯酸钠发生器一套。计划总投资额为225.52万元，计划完成时间2023年12月27日，项目的实施将提升村民生活质量，保障居民健康，助力农业发展，保护生态环境。群众满意度90%以上。具体效益目标见下表：

序号	指标	项目名称	项目指标/建筑规模	金额（万元）
1	产出	建筑工程	砖混结构设备间、净化设备、次氯酸钠发生器	201.79
2		其他费用	建设单位管理费、监理费、实施方案编制费、可研编制费、设计费、清单、控制价编制费	23.73

合计		225.52
----	--	--------

（四）项目实施情况

（1）西社镇沙沟村饮水安全巩固提升项目于2023年6月19日与山西众泰达工程设计咨询有限公司建设工程设计合同，委托山西众泰达工程设计咨询有限公司对生活饮用水进行检测，并于2023年7月7日出具了检测报告。2023年8月17日与山西龙腾工程监理有限公司签订监理合同书。2023年9月18日与山西晋宇工程造价咨询有限公司签订预算审核（B）类建设工程造价咨询合同。山西新盛宇建设工程有限公司于2023年9月21日中标，并于2023年9月22日签订施工合同，金额为249.65万元，建设工程开工时间为2023年9月24日，竣工时间为2024年7月10日。2024年9月2日与山西天信工程项目管理有限公司签订建设工程造价咨询合同。2024年10月15日与吕梁正乾会计师事务所（普通合伙）签订竣工财务决算审计业务约定书。西社镇沙沟村饮水安全巩固提升项目工程已验收，工程验收合格率100%，实际投资总额277.63万元。

（2）夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造项目于2023年6月19日与山西众泰达工程设计咨询有限公司签订建设工程设计合同，于2023年9月8日与山西正建招标代理有限公司签订政府采购委托代理协议。2023年9月21日承峻建设科技（山西）有限公司中标，于2023年9月22日签订合同，合同金额322万元。工程于2023年9月24日开工，2023年12月2日竣工。2024年2月7日与山西天信工程项目管理有限公司签订建设工程造价咨询合同。2024年10月15日与吕梁正乾会计师事务所（普通合伙）签订竣工财务决算审计业务约定书。工程已验收，工程

验收合格率100%，实际投资总额354.27万元。

(3) 水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目于2023年9月2日与金策工程管理有限公司签订造价咨询合同。2023年9月6日与山西水元素水利工程设计有限公司签订技术咨询合同。2023年9月18日与山西晋宇工程造价咨询有限公司签订预算审核(B)类建设工程造价咨询合同。2023年9月25日与山西龙腾工程监理有限公司签订施工监理合同书。山西新净界环保科技有限公司于2023年11月21日中标，中标金额为1,520,000.00元，并于2023年11月23日签订设备合同。与交城县永裕源施工服务队于2023年9月28日签订工程承揽合同，合同金额为475,782.33元。2024年10月15日与吕梁正乾会计师事务所(普通合伙)签订竣工财务决算审计业务约定书。工程于2023年9月28日开工，2023年12月27日完工，工程已验收合格，实际投资总额213.84万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

(1) 绩效评价目的

通过对西社镇沙沟村饮水安全巩固提升项目、夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造项目、水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目进行绩效评价，以评价项目的立项是否充分、资金是否到位，支出是否合理，项目的产出和效果为主要内容，及时发现项目的实施过程中出现的问题，找出恰当的解决办法并提出合理建议，为如何使用以后年度财政预算提供重要的参考依据。

(2) 项目范围及内容

①项目名称：西社镇沙沟村饮水安全巩固提升项目；

项目建设地点：西社镇沙沟村；

项目规模及内容：新建截潜流1座；新建300m³钢筋混凝土蓄水池1座；铺设输水De125PE管3144m，De110PE管948m；新建排气井3座、减压井3座、阀门井1座、砖砌矩形阀井1座等。

项目计划总投资291.19万元。其中：建设工程费为258.82万元，其他费用为32.37万元。

②项目名称：夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造项目；

项目建设地点：夏家营镇贾家寨村；

项目规模及内容：①铺设输水PE管道17425m，其中De125PE管1609m，De90PE管446m，De63PE管1410m，De50PE管13960m；②新建阀门井172座；③配套入户管De25PE管23800m、智能防水刷卡水表990个。

项目计划总投资394.64万元。其中：建设工程费为348.95万元，其他费用为45.69万元。

③项目名称：水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目；

项目建设地点：水峪贯镇水峪贯村、水峪贯镇西冶村、水峪贯镇鲁沿村、水峪贯镇岭上、西社镇西社村、西社镇东社村、西社镇沙沟村、西社镇大岩头村、西社镇米家庄村；

项目规模及内容：在水峪贯镇鲁沿村新建一座60.48m²砖混结构设备间，安装16t/h净化设备、100g/h次氯酸钠发生器各一套；在西社镇东社村新建一座60.48m²砖混结构设备间，安装10t/h净化设备、100g/h次氯酸钠发生器各一套；西社镇大岩头村新建一座46.08m²砖混结构设备间，安装10t/h净化设备、100g/h次氯酸钠发生器各一套；在水峪贯

镇水峪贯村、水峪贯镇西冶村、水峪贯镇岭上、西社镇西社村、西社镇沙沟村、西社镇米家庄村各安装100g/h次氯酸钠发生器一套。

项目计划总投资225.52万元。其中：工程费用201.79万元，工程建设其他费23.73万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价依据

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则

绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

（2）公正公平原则

绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

（3）绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系及评价标准

根据本次评价目的和所评价的对象，以及项目的主要内容，以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”为指导思想，遵循相关性、重要性、可比性、系统性和经济性原则，结合项目实际，最终形成19个三级指标。（评价指标体系详见附件1）

3、评价方法

（1）因素分析法

是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（2）比较法

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度的评价方法；

（3）公众评判法

是指通过发放调查问卷及抽样调查等方式，对项目进行评判，评价其绩效目标实现程度。

4、评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）；

（3）山西省财政厅关于印发《省级项目支出绩效评价管理办法》的通知（晋财绩[2020]17号）；

（4）会计师事务所财政支出绩效评价业务指引（会协[2016]10号）；

（5）山西省财政厅关于印发《财政专项资金监管办法》的通知（晋财省直预[2021]9号）；

（6）《山西省财政厅省级财政专项资金管理办法》（晋财预[2015]70号）；

（7）交城县人民政府办公室《关于印发交城县2023年统筹整合使用财政资金巩固脱贫成果衔接乡村振兴实施方案（调整）》通知（交政办发〔2023〕30号）；

(8) 交城县财政局关于印发《2024年度县级财政重点绩效评价实施方案的通知》（交财绩〔2024〕7号）；

(9) 交城县财政局关于印发《交城县财政局关于对于2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金安排建设项目（调整）》通知（交政办发〔2024〕25号）；

(10) 其他有关的法律、法规规章、政策文件。

（三）绩效评价工作过程

评价工作分为前期准备、现场实施、评价报告撰写和提交三个阶段。

1、前期准备阶段

(1) 成立绩效评价工作组,确定评价指标,制定评价工作底稿、评价报告内容;

(2) 根据文件规定时间,制定评价实施方案,确定现场评价时间;

(3) 确定被评单位需要配合的事项;

(4) 完成评价人员的培训;

(5) 收集整理被评价单位的相关资料。

2、现场实施阶段

(1) 与项目单位进行沟通,确定评价工作组现场工作安排;

(2) 评价工作组对上报的相关资料进行审查、复核和测评;

(3) 评价工作组到现场,按照评价标准和规范,对各项指标进行计算和打分。

3、报告撰写和提交阶段

- (1) 评价工作组根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，撰写被评单位的绩效评价报告；
- (2) 与被评价单位就绩效评价报告进行充分沟通并交换意见；
- (3) 评价工作组于2024年11月15日提交正式评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价工作组按照本项目的绩效评价实施方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析，经综合评价，乡村振兴水利工程项目，基本按照项目实施方案，以及资金管理办法等各项规章制度的要求执行。

本项目得分为90.00分，绩效评价等级为“优秀”。其中：项目决策情况指标考评得分为 19.00 分，说明项目立项依据充分且具备可行性，预算编制科学，资金分配合理，但个别绩效目标设置不合理；项目过程指标考评得分为 20.00 分，说明预算执行率高，到位资金使用合规，管理制度健全并有效执行；项目产出指标考评得分为 21.00 分，说明质量已达标、但个别项目完成不及时；项目效益指标考评得分为 30 分，说明项目带来的经济效益、社会效益高，配套基础设施服务年限15年以上，可为当地群众带来长期的受益，持续性影响明显，综合满意度较高。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

该指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三方面。分值20.00分，得分 19.00 分，得分率95%。详见表 1：

表1 项目决策情况指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20分	项目立项	7分	立项依据充分性	4分	4分
				立项程序规范性	3分	3分
		绩效目标	7分	绩效目标合理性	4分	4分
				绩效指标明确性	3分	2分
		资金投入	6分	预算编制科学性	4分	4分
				资金分配合理性	2分	2分

1、项目立项情况分析

(1) 立项依据：满分4.00分，得分4.00分。

①根据交城县水利局《关于2023年交城县夏家营镇贾家寨村、西社镇沙沟村农村饮水安全工程项目实施方案的批复》（交水字〔2023〕57号）文件，结合西社镇沙沟村目前无固定供水水源，供水得不到保障，严重影响当地的生产和生活的实际情况，编制西社镇沙沟村饮水安全巩固提升工程实施方案。项目计划总投资291.19万元，其中建设工程费258.82万元，其他费用32.37万元。

②根据交城县水利局《关于2023年交城县夏家营镇贾家寨村、西社镇沙沟村农村饮水安全工程项目实施方案的批复》（交水字〔2023〕57号）文件，结合贾家寨村村内供水网管及来水主管线运行已有30余年，现状管线老化、破损严重，维修维护成本极大，漏水损坏时有发生，村民用水得不到保障的实际情况，编制夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造工程实施方案。项目计划总投资394.64万元，其中建设工程费348.95万元，其他费用45.69万元。

③根据交城县水利局《关于2023年交城县水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目实施方案的批复》（交水字〔2023〕83号）等文

件，结合当地菌落总数与总大肠杆菌群含量超标的实际情况，编制交城县水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目实施方案。项目计划总投资225.52万元，其中工程费用201.79万元，工程建设其他费用23.73万元。

项目立项符合国家相关政策、行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符、属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，立项依据充分，得4.00分。

(2) 立项程序：满分3.00分，得分3.00分。

项目按规定程序申请设立，设立过程符合相关要求和程序，取得立项批复、相关审批文件，有必要的实施方案，立项程序规范，得3.00分。

2、绩效目标设置情况分析

(1) 绩效目标合理性：满分4.00分，得分4.00分。

根据项目实施方案，目标与实际工作内容相关，目标预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得4.00分。

(2) 绩效目标明确性：满分3.00分，得分2.00分。

根据项目实施方案及绩效自评报告，项目个别绩效指标设置不合理，数量指标未细化，成本指标设置错误，群众满意度指标设置不合理，扣1.00分，得2.00分。

3、资金投入情况分析

(1) 预算编制科学性：满分4.00分，得分4.00分。

山西众泰达工程设计咨询有限公司编制西社镇沙沟村饮水安全巩固提升工程及夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造工程实施方案，山西水元素水利工程设计有限公司编制交城县水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目，编制内容与项目内容匹配，投资额与工作任务相匹配，编制依据充分，得 4.00 分。

(2) 资金分配合理性：满分 2.00 分，得分 2.00 分。

根据相关财务资料，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得 2.00 分。

(二) 项目过程情况

该指标包括资金管理和组织实施两方面。分值20.00分，得分20.00分，得分率100.00%。详见表2：

表2 资金投入指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
过 程	20 分	资金管理	12 分	资金到位率	4 分	4 分
				预算执行率	4 分	4 分
				资金使用合规性	4 分	4 分
		组织实施	8 分	管理制度健全性	4 分	4 分
				制度执行有效性	4 分	4 分

1、资金管理情况分析

(1) 资金到位率：满分 4.00 分，得分 4.00 分。

根据交城县财政局《关于下达项目支出预算指标的通知》，截至2024年10月31日，西社镇沙沟村饮水安全巩固提升工程项目预算资金222.00万元，项目实际到位资金222.00万元，资金到位率100.00%；夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造工程项目预算资金344.04万元，实际到位资金344.04万元，资金到位率100.00%；水峪贯镇、西社镇9

村水质消毒净化项目预算资金207.30万元，实际到位资金207.30万元，资金到位率100.00%。

本次乡村振兴水利工程项目实际到位资金总额为773.34万元，项目预算资金总额为773.34万元，资金到位率100.00%，得分 4.00分。

(2) 预算执行性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。

经评价工作组查阅会计凭证等相关财务资料，截至2024年10月31日，项目实际总支出资金773.34万元，已使用773.34万元，无结余，得4.00分。

(3) 资金使用合规性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。

评价工作组经过查看相关文件和相关凭证及财务资料，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序及手续，资金的使用符合项目预算规定的用途，得 4.00 分。

2、组织实施情况分析

(1) 管理制度健全性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。

经过对交城县水利局财务制度、预算管理制度相关资料的查询，该项目单位设账核算且财务、预算制度健全，能够提供相关会计凭证、单据及账簿，会计核算规范，相关档案归档及时，得 4.00分。

(2) 制度执行有效性：满分 4.00 分，得分 4.00 分。

本次乡村振兴水利工程的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，未涉及调整，项目各项资料齐全并及时归档，项目实施人员条件、场地设备等落实到位，得 4.00 分。

(三)项目产出情况

该指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面。
分值30.00分，得分21.00分，得分率70%。详见表3：

表3 项目实现程度及效果指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出	30分	产出数量	30分	实际完成率	10分	9分
		产出质量		质量达标率	8分	5分
		产出时效		完成及时性	6分	4分
		产出成本		成本节约率	6分	3分

1、项目产出数量目标的实现程度分析

(1) 实际完成率：满分 10.00 分，得分 9.00 分。主要考核项目产出数量绩效目标完成情况。

根据乡村振兴水利工程项目竣工验收报告和结算审核报告，该项目实际完成数量如下：

①西社镇沙沟村饮水安全巩固提升工程

计划新建截潜流1座，实际新建截潜流1座；计划新建300m³钢筋混凝土蓄水池1座，实际新建300m³钢筋混凝土蓄水池1座；计划铺设输水De125PE管3144m、De110PE管948m，实际铺设输水De125PE管3144m、De110PE管1077.38m；计划新建排气井3座、减压井3座、阀门井1座、砖砌矩形阀井1座，实际新建排气井4座、减压井3座、阀门井1座、砖砌矩形阀井1座；计划配套水表及阀门420个，实际配套水表及阀门420个。完成率100%。

②夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造工程

计划铺设输水PE管道17425m，实际完成17376m，完成率99.72%；计划新建阀门井172座，实际完成172座；计划安装配套入户管De25PE

管23800m，实际完成40080m；计划安装智能防水刷卡水表990个，实际完成980个，完成率99%。

③水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目

在水峪贯镇鲁沿村新建一座60.48m²砖混结构设备间，安装16t/h净化设备、100g/h次氯酸钠发生器各一套；在西社镇东社村新建一座60.48m²砖混结构设备间，安装10t/h净化设备、100g/h次氯酸钠发生器各一套；西社镇大岩头村新建一座46.08m²砖混结构设备间，安装10t/h净化设备、100g/h次氯酸钠发生器各一套；在水峪贯镇水峪贯村、水峪贯镇西冶村、水峪贯镇岭上、西社镇西社村、西社镇沙沟村、西社镇米家庄村各安装100g/h次氯酸钠发生器一套。上述安装建设任务全部完成，完成率100.00%。

2、项目产出质量目标的实现程度分析

质量达标率：满分 8.00 分，得分 5.00 分。

根据乡村振兴水利工程各项目竣工验收证明书，在施工过程中，严格按照建筑法律、法规，建筑工程质量管理条例施工图纸施工规定进行施工，交城县水利局对本项目实行了日常跟踪管理，山西龙腾工程监理有限公司负责审查工程施工质量，工程已完工，并进行了竣工验收，验收合格，质量等级未达优秀，扣 3.00 分，得 5.00 分。

3、项目产出时效目标的实现程度分析

完成及时率：满分 6.00 分，得分 4.00 分。

根据项目立项文件及施工合同，夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造工程项目开工时间为2023年9月24日，竣工时间为2023年12月2日。根据其项目竣工验收证明书，工程已按期完工，完成及时率

100%。水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目开工时间为2023年9月28日，竣工时间为2023年12月27日。根据其项目竣工验收证明书，工程已按期完工，完成及时率100%。西社镇沙沟村饮水安全巩固提升工程项目开工时间为2023年9月24日，计划竣工时间为2023年12月24日，实际竣工时间为2024年7月10日，工程存在延期，扣2.00分，得4.00分。

4、项目的成本节约程度分析

成本节约率：满分 6.00 分，得分 3.00 分。

本次乡村振兴水利工程项目计划总成本911.35万元，实际总成本845.74万元，成本节约65.61万元，成本节约率7.20%，扣3.00分，得3.00分。

(四)项目效益情况

该指标包括经济效益、社会效益、可持续影响、群众满意度四方面。分值30.00分，得分30.00分，得分率100%。详见表4：

表4 项目实现程度及效果指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目实现程度及效果	30分	实施效益	24分	经济效益	8分	8分
				社会效益	8分	8分
				可持续影响	8分	8分
		满意度	6分	群众满意度	6分	6分

1、项目实施所产生的效益分析

(1) 经济效益指标分析：满分 8.00 分，得分 8.00 分。

减少水资源浪费和水费支出：管网改造项目实施后，改造后的管网能有效减少跑冒滴漏等现象，提高水资源的输送效率，降低水损。

用水量的减少会使村民的水费支出相应降低，长期来看减轻了村民的经济负担。

带动相关产业发展：管网改造工程的实施会带动管道、阀门、施工设备等相关产业的发展。在工程建设过程中，需要采购大量的管材、管件、阀门等材料，以及使用各种施工机械和设备，这为相关材料供应商和设备租赁商提供了商机，促进了这些产业的发展，增加了相关企业的收入和就业机会。

降低医疗费用支出：经过消毒净化后的水，水质得到提升，能够减少因饮用不洁水而引发的各种疾病，如腹泻、痢疾、肝炎等胃肠道疾病以及其他水媒疾病。村民患病的概率降低，相应的医疗费用支出也会减少。这不仅减轻了村民的经济负担，也为整个村庄节省了医疗资源。

提高农产品质量和附加值：在农业生产中，优质的灌溉水对农产品的质量有着重要的影响。水质消毒净化后，用于灌溉的水更加清洁，能够减少对农作物的污染，提高农产品的质量和安全性。

综上所述，饮水安全管网改造工程和水质消毒净化项目经济效益显著，得 8.00 分。

(2) 社会效益指标分析：满分 8.00 分，得分 8.00 分。

项目建设实施后，可以直接提高农民的生活质量和健康水平，解放农村生产力，直接增加农民收益，为提前步入富裕型小康社会提供必要条件；方便生活用水，节省大量农村劳力，缺水地区群众彻底摆脱吃水难的境遇，告别到村外、甚至更远的地方拉水的日子；促进农村经济发展，大量劳动力可以集中精力搞养殖、种植业以及其他生产

经营活动，增加个体收入，提高家庭经济水平，对社会安定团结、精神文明建设、改善生态环境及社会环境有着直接意义，社会效益显著，得 8.00 分。

(3) 可持续发展指标分析

可持续影响：满分 8.00 分，得分 8.00 分。

项目实施后，配套基础设施服务年限15年以上，可为当地群众带来长期的受益，得 8.00 分。

2、社会公众对项目实施效果的满意度分析：满分 6.00 分，得分 6.00 分。

评价工作组通过调查问卷的3个问题分析得出：（详见附件3）

(1) 本次改善项目工作的满意度方面表示比较满意，本项满意度91%。

(2) 本次改善项目改善效果满意度方面表示比较满意，本项满意度92%。

(3) 本次改善项目建成后，用水便利程度，提升用水质量，保障身体健康，改善村民生活条件的满意度方面表示比较满意，本项满意度93%。

上述3个问题，每问的权重为1/3，根据问卷调查的统计结果最终确定的满意度为 $= (91\% + 92\% + 93\%) / 3 = 92.00\%$ ，得 6.00 分。

(五) 项目政策实施效率及效果分析

本次改善项目的实施，保障了居民用水便利性及安全性，保障了居民身体健康，提升了生活质量；节约了水资源，减少了公共资源的浪费，带动了相关产业的发展，推动农村经济的进步，保护了农村生

态环境。

五、项目自评核实及复核结论

（一）绩效自评核实情况

1、项目绩效目标完成情况

2023年乡村振兴水利工程项目设定的绩效目标6项，已基本完成，根据交城县水利局提供的资料和现场核查，绩效目标完成情况核查结果如下：

（1）数量指标：

自评报告反映：①西社镇沙沟村饮水安全巩固提升工程1处；②夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造工程1处；③水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目实施水质消毒净化项目的村数9处。

经复核数量指标设置笼统。西社镇沙沟村饮水工程数量指标设置应为：新建截潜流1座，新建300m³钢筋混凝土蓄水池1座，铺设输水De125PE管3144m、De110PE管948m等（计划数及其完成数）；夏家营镇贾家寨村饮水工程数量指标设置应为：铺设输水PE管道17425m，新建阀门井172座，计划安装配套入户管De25PE管23800m等（计划数及其完成数）；水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目数量指标设置应为：新建60.48m²砖混结构设备间一座，安装16t/h 净化设备、100g/h次氯酸钠发生器各一套等（计划数及其完成数）。

（2）质量指标：

自评报告反映：保证受益村饮水工程良性运行，工程建设完成合格率100%，经复核情况属实。

（3）时效指标：

自评报告反映：截止2024年10月底年度任务完成率100%。工程已完工，经复核情况属实。

（4）成本指标：

自评报告反映：成本指标为单价是否控制在单价批复概算单价内。经复核成本指标设置错误，应反映为项目投资额。

（5）效益指标：

自评报告反映：①西社镇沙沟村饮水安全巩固提升工程1处工程已完成完工验收。工程全部运行正常，工程正常运行率100%。保证了沙沟村0.1525万人的饮水安全。②夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造工程1处工程已完成完工验收。工程全部运行正常，工程正常运行率100%。保证了贾家寨村0.33万人的饮水安全。③交城县水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目9处工程已完成完工验收。工程全部运行正常，工程正常运行率100%。保证了水峪贯镇水峪贯村、西冶村、鲁沿村、岭上、西社镇西社村、东社村、沙沟村、大岩头村、米家庄村共计1.5万人农村人口的饮水安全。经复核属实。

（6）服务对象满意度指标：

一是绩效目标自评表服务对象满意度指标值填写不合理

自评报告反映：受益群众满意度指标值为100%，经复核，群众满意度指标值填写不合理，指标值应在95%-100%的区间内，而不是一个固定数值。

二是服务对象满意度指标未提供相关佐证资料

自评报告反映：受益群众满意度指标值为100%未提供相关佐证资料，经复核：评价工作组现场调查下发60份问卷，通过对问卷中3个

满意度问题调查结果分析得出，受益群众满意度综合满意度92%。

2、项目资金使用情况

2023年乡村振兴水利工程项目实际到位资金773.34万元，已使用773.34万元，无结余。

3、综合评价结论得分

自评报告反映：2023年乡村振兴水利工程项目按要求开展，并已完成，根据交城县水利局提供的绩效目标自评表，自评报告综合评价结论得分100分。

我所经过对交城县水利局报送的自评材料进行核实，2023年乡村振兴水利工程项目绩效目标明确合理、资金到位及时、资金拨付审批完整，项目完成率较高，较好地发挥经济效益、社会效益和生态效益，满意度较高。经复核后，本项目综合评价得分90.00分，绩效等级为“优”。

六、项目主要绩效及经验做法

(一)主要绩效

(1) 西社镇沙沟村饮水安全巩固提升工程

新建截潜流1座，新建300m³钢筋混凝土蓄水池1座，铺设输水De125PE管3144m、De110PE管1077.38m，新建排气井4座、减压井3座、阀门井1座、砖砌矩形阀井1座，配套水表及阀门420个。

(2) 夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造工程

铺设输水PE管道17376m，新建阀门井172座，安装配套入户管De25PE管40080m，安装智能防水刷卡水表980个。

(3) 水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目

在水峪贯镇鲁沿村新建一座60.48m²砖混结构设备间，安装16t/h净化设备、100g/h次氯酸钠发生器各一套；在西社镇东社村新建一座60.48m²砖混结构设备间，安装10t/h净化设备、100g/h次氯酸钠发生器各一套；西社镇大岩头村新建一座46.08m²砖混结构设备间，安装10t/h净化设备、100g/h次氯酸钠发生器各一套；在水峪贯镇水峪贯村、水峪贯镇西冶村、水峪贯镇岭上、西社镇西社村、西社镇沙沟村、西社镇米家庄村各安装100g/h次氯酸钠发生器一套。

本次改善项目的实施，保障了居民用水便利性及安全性带动了相关产业的发展，推动农村经济的进步，保护了农村生态环境。群众满意度较高。

（二）主要经验做法

1、组织机构健全

交城县水利局组织机构健全，各部门分工明确、各司其职、齐抓共管，有效推动了乡村振兴水利工程项目的运行。

2、资金使用较为规范

乡村振兴水利工程项目资金使用较为规范，基本按照实施方案及有关政策的规定执行。

3、专人负责项目跟踪管理工作

交城县水利局派专人进行项目跟踪管理工作，以确保乡村振兴水利工程项目能够保质保量完成，防止管网改造、饮水安全巩固提升工程及水质消毒净化建设不合格情况发生，对项目实施起到了很好的监督管理作用。

七、项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析

1、个别工程延期完工

经评价工作组查阅相关文件资料，发现工程项目中的西社镇沙沟村饮水安全巩固提升工程计划竣工日期为2023年12月24日，实际竣工日期为2024年7月10日，延期6个月。

2、复核自评报告个别绩效目标错误及群众满意度指标未提供相关佐证资料

(1) 项目数量指标设置笼统

如西社镇沙沟村项目数量指标设置为饮水安全巩固提升工程1处，经复核数量指标应设置为：新建截潜流1座，新建300m³钢筋混凝土蓄水池1座，铺设输水De125PE管3144m、De110PE管948m等（计划数及其完成数分别反映）。

(2) 项目成本指标设置错误

自评报告反映成本指标设置为单价是否控制在单价批复概算单价内，经复核成本指标应设置为项目投资额。

(3) 服务对象满意度指标值设置错误以及未提供相关佐证资料

自评报告反映：服务对象满意度指标值为100%，经复核，指标值设置错误，指标值应在95%-100%的区间内，而不是一个固定数值，以及自评报告服务对象满意度指标未提供相关佐证资料。

八、下一步改进意见及政策建议

1、加强管理，避免项目延期

确定严格的项目管理流程，避免项目延期。在后续项目中加强工程建设现场的监督和管理，严格按照施工进度计划进行监督，保障施工按计划完成。

2、对自评报告填写不规范的部分进行整改，服务对象满意度指标实际值应提供相关佐证资料。

九、绩效评价结果应用建议

（一）财政部门或预算部门在预算安排时应考虑项目完成程度和绩效目标实现效果。

（二）绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定在一定范围内公开。

（三）确定严格的项目流程，避免项目延期，保证施工进度；对自评报告填写不规范的部分进行整改，服务对象满意度指标实际值应提供相关佐证资料。

十、报告附件

附件1：绩效评价指标体系

附件2：绩效评价调查问卷

附件3：绩效评价问卷调查

附件4：绩效评价指标体系项目绩效分值

评价机构：吕梁正乾会计师事务所（普通合伙）

二〇二四年十一月十五日

附件1

乡村振兴水利工程项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释
决策	20分	项目立项	7分	立项依据充分性	4分	项目立项符合国家相关政策、行业发展规划和政策要求（1分）；项目立项与部门职责范围相符、属于部门履职所需（1分）；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）
				立项程序规范性	3分	项目按规定程序申请设立（1分）；取得立项批复，相关审批文件（1分）；有必要的可行性研究、专家论证（1分）
		绩效目标	7分	绩效目标合理性	4分	设置绩效目标（1分）；目标与实际工作内容相关（1分）；目标预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）
				绩效指标明确性	3分	目标具体细化（1分）；目标具体量化（1分）；目标与项目任务数或计划数相对应（1分）
				预算编制科学性	4分	预算编制经过科学论证（1分）；预算内容与项目内容匹配（1分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）
过程	20分	资金投入	6分	资金分配合理性	2分	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）
				资金到位率	4分	$(\text{实际到位金额} / \text{预算资金}) \times 100\% \times 4\text{分}$
		资金管理	12分	预算执行率	4分	$(\text{实际支出金额} / \text{实际到位金额}) \times 100\% \times 4\text{分}$
				资金使用合规性	4分	符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况（1分）
				管理制度健全性	4分	已制定或者具有相应的财务和业务管理制度（2分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（2分）
		组织实施	8分	制度执行有效性	4分	项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目调整及支出手续完备（1分）；项目合同书、验收报告、竣工财务决算等技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）

乡村振兴水利工程项目绩效评价指标体系

续表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释
产出	30分	产出数量	30分	实际完成率	10分	(实际产出数/计划产出数) × 100%，项目全部完工（10分），每递减 10% 扣 2 分，50%以下不得分
		产出质量		质量达标率	8分	项目完工后，项目主管部门组织进行检查验收（5分），质量优秀（3分），每低一个等级扣 1 分
		产出时效		完成及时性	6分	按计划时间完工（6分），否则每晚 1 个月扣 1 分，扣完本分值为止
		产出成本		成本节约率	6分	[（计划成本-实际成本）/计划成本] × 100%，成本节约得 3 分，每提高 10%得 1 分，最大不超目标值
				经济效益	8分	项目产生的经济效益有哪些（8分）
效益	30分	实施效益	24分	社会效益	8分	项目社会效益展现在哪些方面（8分）
				可持续影响	8分	项目实施后可产生较深的持续性影响（8分）；持续性影响不明显（4分）；无持续性影响（0分）
				群众满意度	6分	通过问卷调查等方式，公众满意度达到90%以上得 6 分，每少10个百分点扣 1 分，低于50%不得分

评价实行百分制，按照综合评分级：综合评分 90 分（含）以上为“优秀”，80-89 分为“良好”，60-79 分为“中”，60 分以下为“差”。

附件2

乡村振兴水利工程项目

绩效评价调查问卷

（西社镇沙沟村饮水安全巩固提升工程）

尊敬的先生/女士：

您好！感谢您参加“乡村振兴水利工程项目”的调查工作，此次调查针对西社镇沙沟村饮水安全巩固提升工程，旨在了解饮水安全巩固提升工程的实施情况，项目实施后实现的经济和社会效益。特此说明：本次调查采取匿名形式，您所填写的信息我们将严格保密，您可以放心作答。

1、您的居住地址？

2、您知道西社镇沙沟村饮水安全巩固提升工程建设这回事吗？

☐ 是

☐ 否

3、您认为西社镇沙沟村饮水安全巩固提升工程项目是否必要？

☐ 是

☐ 否

4、改造后是否为您创造了更好的饮水条件？

☐ 是

☐ 否

5、您对西社镇沙沟村饮水安全巩固提升工程工作满意吗？

☐ 非常满意

☐ 比较满意

☐ 基本满意

☐ 不满意

6、您对西社镇沙沟村饮水安全巩固提升工程项目改善效果满意度？

☐ 非常满意

☐ 比较满意

☐ 基本满意

☐ 不满意

7、您对西社镇沙沟村饮水安全巩固提升工程项目建成后，用水便利程度，提升用水质量，保障身体健康，改善村民生活条件的满意度？

☐ 非常满意

☐ 比较满意

☐ 基本满意

☐ 不满意

8、您对西社镇沙沟村饮水安全巩固提升工程项目的实施还有哪些建议或意见？

乡村振兴水利工程项目

绩效评价调查问卷

(夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造工程)

尊敬的先生/女士:

您好!感谢您参加“乡村振兴水利工程项目”的调查工作,此次调查针对夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造工程,旨在了解饮水安全巩固提升工程的实施情况,项目实施后实现的经济和社会效益。特此说明:本次调查采取匿名形式,您所填写的信息我们将严格保密,您可以放心作答。

1、您的居住地址?

☐ 交城县夏家营镇贾家寨村

☐ 交城县夏家营镇及附近

☐ 交城县区域内

☐ 其他

2、您知道夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造工程建设这回事吗?

☐ 是

☐ 否

3、您认为夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造工程项目是否必要?

☐ 是

☐ 否

4、改造后是否为您创造了更好的饮水条件?

☐ 是

☐ 否

5、 您对夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造工程施工工作满意吗？

☐ 非常满意

☐ 比较满意

☐ 基本满意

☐ 不满意

6、您对夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造工程项目改善效果满意度？

☐ 非常满意

☐ 比较满意

☐ 基本满意

☐ 不满意

7、您对夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造工程项目建成后，用水便利程度，提升用水质量，保障身体健康，改善村民生活条件的满意度？

☐ 非常满意

☐ 比较满意

☐ 基本满意

☐ 不满意

8、您对夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造工程施工项目的实施还有哪些建议或意见？

乡村振兴水利工程项目

绩效评价调查问卷

（水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目）

尊敬的先生/女士：

您好！感谢您参加“乡村振兴水利工程项目”的调查工作，此次调查针对水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目，旨在了解饮水安全巩固提升工程的实施情况，项目实施后实现的经济和社会效益。特此说明：本次调查采取匿名形式，您所填写的信息我们将严格保密，您可以放心作答。

1、您的居住地址是？

2、您知道水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目建设这回事吗？

☐ 是

☐ 否

3、您认为水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目项目是否必要？

☐ 是

☐ 否

4、改造后是否为您创造了更好的饮水条件？

☐ 是

☐ 否

5、 您对水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目工作满意吗？

☐ 非常满意

☐ 比较满意

☐ 基本满意

☐ 不满意

6、您对水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目项目改善效果满意度？

☐ 非常满意

☐ 比较满意

☐ 基本满意

☐ 不满意

7、您对水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目项目建成后，用水便利程度，提升用水质量，保障身体健康，改善村民生活条件的满意度？

☐ 非常满意

☐ 比较满意

☐ 基本满意

☐ 不满意

8、您对水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目项目的实施还有哪些建议或意见？

附件3

乡村振兴水利工程项目

绩效评价问卷调查

一、 调查目的

通过问卷调查，我们将根据问卷调查结果对乡村振兴水利工程项目服务对象满意度进行评分。

二、 调查对象

本次调查问卷（西社镇沙沟村饮水安全巩固提升工程）抽样对象为西社镇沙沟村、及附近及交城县区域内居民。

本次调查问卷（夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造工程）抽样对象为夏家营镇贾家寨村、及附近及交城县区域内居民。

本次调查问卷（水峪贯镇、西社镇9村水质消毒净化项目）抽样对象为水峪贯镇水峪贯村、水峪贯镇西冶村、水峪贯镇鲁沿村、水峪贯镇岭上、西社镇西社村、西社镇东社村、西社镇沙沟村、西社镇大岩头村、西社镇米家庄村及交城县区域内居民。

三、 调查方法

本次问卷调查将随机抽取，共发放问卷60份，并对问卷进行有效性审查。

四、 调查人

绩效评价工作组。

五、 调查内容

主要了解乡村振兴水利工程项目执行结果的满意度。

六、调查结果统计如下：

（一）调查问卷基本情况统计如下：

1. 您的居住地址？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 西社镇沙沟村	7	12%
B. 西社镇东社村	7	12%
C. 西社镇大岩头村	7	12%
D. 夏家营镇贾家寨村	6	10%
E. 水峪贯镇水峪贯村	6	10%
F. 水峪贯镇西冶村	6	10%
G. 水峪贯镇鲁沿村	6	10%
H. 水峪贯镇岭上	6	10%
I. 西社镇西社村	6	10%
J. 交城县其他区域	3	5%
本题有效填写人次	60	100%

本次调查问卷下发60份，各村人数及占比见上表。

2. 您知道本次乡村振兴水利工程项目建设这回事吗？


选项	小计	比例
是	55	92%
否	5	7%
本题有效填写人次	60	

3. 您认为乡村振兴水利工程项目是否必要？ [单选题]

选项	小计	比例
是	60	 100%
否	0	 0%

本题有效填写人次

60

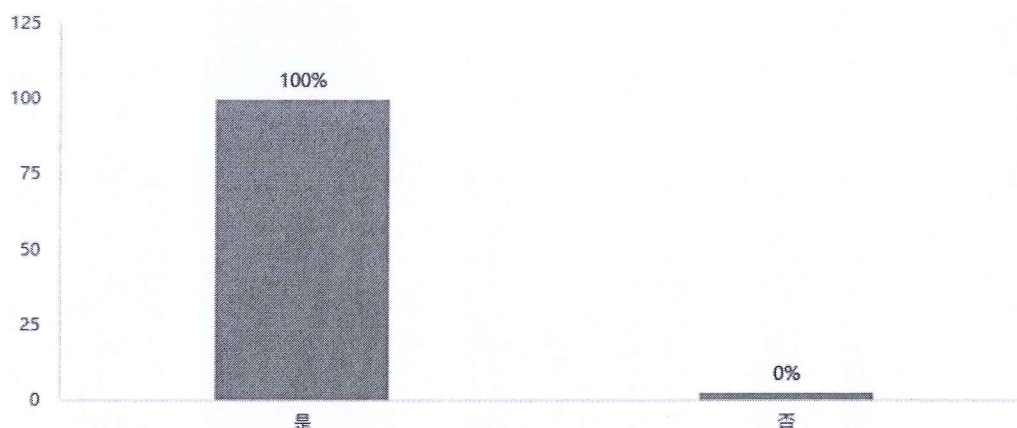

经调查表明：被调查群众100%认为乡村振兴水利工程项目非常必要，是惠民利民的好工程。

4. 改造后是否为您创造了更好的饮水条件？

选项	小计	比例
是	55	100%
否	0	0%
本题有效填写人次	55	

5. 您对乡村振兴水利工程项目工作满意度？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意（满意度100%）	35	64%
B. 比较满意（满意度80%）	17	31%
C. 满意（满意度60%）	4	7%
D. 不满意（满意度0%）	1	2%
本题有效填写人次	55	100%

经调查表明：乡村振兴水利工程项目工作的满意度方面表示比较满意，本项满意度 = $(64\% \times 100\% + 31\% \times 80\% + 7\% \times 60\% + 2\% \times 0\%) = 91\%$ 。

6. 您对乡村振兴水利工程项目改善效果满意度？

[单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意（满意度100%）	39	71%
B. 比较满意（满意度80%）	12	22%
C. 满意（满意度60%）	3	5%
D. 不满意（满意度0%）	1	2%
本题有效填写人次	55	100%

经调查表明：乡村振兴水利工程项目改善效果满意度方面表示比较满意，本项满意度 = $(71\% \times 100\% + 22\% \times 80\% + 5\% \times 60\% + 2\% \times 0) = 92\%$ 。

7. 您对乡村振兴水利工程项目建成后，用水便利程度，提升用水质量，保障身体健康，改善村民生活条件的满意度？[单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意（满意度100%）	42	76%
B. 比较满意（满意度80%）	9	16%
C. 满意（满意度60%）	3	5%
D. 不满意（满意度0%）	1	2%
本题有效填写人次	55	100%

调查表明：用水便利程度，提升用水质量，保障身体健康，改善村民生活条件的满意度方面表示比较满意，本项满意度 = $(76\% \times 100\% + 16\% \times 80\% + 5\% \times 60\% + 2\% \times 0) = 93\%$ 。

8. 您对乡村振兴水利工程项目的实施还有哪些建议或意见？

经调查表明：（1）饮水安全工程方面：希望能定期巡查管

网及其他基础设施，及时发现和处理管道老化、损坏等问题，对发现的漏损点及时修复，保障居民用水；（2）水质消毒净化方面：希望能定期检测水质，根据水中具体的污染物和微生物情况，优化消毒净化的药剂投放量和工艺参数，确保消毒效果的稳定性；设立意见反馈渠道，鼓励村民及时反馈用水过程中发现的水质问题，如异色、异味等。

附件4


乡村振兴水利工程项目绩效分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20分	项目立项	7分	立项依据充分性	4分	4分
				立项程序规范性	3分	3分
		绩效目标	7分	绩效目标合理性	4分	4分
				绩效指标明确性	3分	2分
		资金投入	6分	预算编制科学性	4分	4分
				资金分配合理性	2分	2分
		小计			20分	19分
过程	20分	资金管理	12分	资金到位率	4分	4分
				预算执行率	4分	4分
				资金使用合规性	4分	4分
		组织实施	8分	管理制度健全性	4分	4分
				制度执行有效性	4分	4分
小计			20分	20分		

乡村振兴水利工程项目绩效分值

续表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出	30分	产出数量	30分	实际完成率	10分	9分
		产出质量		质量达标率	8分	5分
		产出时效		完成及时性	6分	4分
		产出成本		成本节约率	6分	3分
		小计				30分
效益	30分	实施效益	24分	经济效益	8分	8分
				社会效益	8分	8分
				可持续影响	8分	8分
		满意度	6分	群众满意度	6分	6分
		小计				30分
合计					100分	90分



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91141122MA7YKKUJ0C 1-1



扫描二维码
录国家企业信
用信息公示系
统,了解更多登
记、备案、许可、
监管信息。

名称 吕梁正乾会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 王洁民

经营范围 许可项目:注册会计师业务;代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:财务咨询;税务服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

成立日期 2021年12月03日

合伙期限 2021年12月03日至长期

主要经营场所 山西省吕梁市交城县天宁镇迎宾大道文洲小区门面房47号一层

登记机关

2021年12月3日



证书序号: 0017546

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

山西省财政厅

二〇二一年十二月二十日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 吕梁正乾会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 王洁民

主任会计师:

山西省吕梁市交城县天宁镇迎宾大道

经营场所:

文洲小区门面房 47 号一层

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 14010081

批准执业文号: 晋财会〔2021〕65 号

批准执业日期: 2021 年 12 月 26 日
