

庞泉沟村食用菌产业发展基地项目 绩效评价报告

委托单位：交城县财政局

项目主管单位：交城县农业农村局

项目实施单位：交城县庞泉沟镇庞泉沟村村民委员会

评价单位：山西荣和义信会计师事务所（普通合伙）

二〇二五年十一月十日



目录	
摘要	4
庞泉沟村食用菌产业发展基地项目绩效评价报告	6
一、基本情况	6
(一) 项目背景	6
(二) 项目立项	7
(三) 项目资金	7
(四) 项目实施内容	7
二、项目绩效目标	8
(一) 总体绩效目标	8
(二) 项目年度目标	8
三、绩效评价工作基本情况	8
(一) 评价目的	8
(二) 评价对象与范围	8
(三) 评价依据	9
(四) 评价原则	9
(五) 评价方法	9
1. 成本效益分析法	10
2. 比较法	10
3. 因素分析法	10
4. 公众评判法	10
(六) 绩效评价指标体系	10
1. 指标体系	10
2. 评价标准	12
(七) 绩效评价工作过程	12
四、综合评价情况及评价结论	14
(一) 项目主要绩效产出	14
1. 完成项目建设情况	14
2. 满意度情况	14



(二) 项目整体结论	14
五、绩效评价指标分析	15
(一) 项目决策情况	15
(二) 项目过程情况	19
(三) 项目产出情况	22
(四) 项目效益情况	25
六、项目主要经验及做法	27
七、存在的问题及原因分析	28
八、意见建议	28
九、附件	29
附件 1 绩效评价指标体系	30
附件 2 合规性检查报告	34
附件 3 访谈报告	37
附件 4 庞泉沟村食用菌产业发展基地项目调查问卷	40
附件 5 满意度调查报告	42



摘要

根据交城县财政局关于印发《2025 年度县级财政重点绩效评价实施方案》的通知（交财绩〔2025〕4 号）文件，山西荣和义信会计师事务所（普通合伙）受交城县财政局委托，承担此次“庞泉沟村食用菌产业发展基地项目”绩效评价工作，通过基础数据填报、问卷调查和访谈等渠道获取相关资料，对照绩效评价指标体系评分标准分析、打分，进行独立、客观地评价。

本次评价的目的在于全面、真实、客观地反映庞泉沟村食用菌产业发展基地项目财政资金使用和绩效状况，评价项目实施单位对该项目的管理情况和具体项目实施情况，总结该项目开展的经验以及不足之处，探索可行、有效的解决方案，提出有针对性的改进意见和建议，提高财政资金使用效益和管理水平，为优化项目实施流程、预算管理水平、财政资金提质增效，提供相关参考和依据。

本次绩效评价的对象为庞泉沟村食用菌产业发展基地项目财政资金使用情况，涉及财政资金 245.00 万元。

本次绩效评价项目预算 378.95 万元，其中财政资金 350.00 万元，自筹资金 28.95 万元。截至报告日，实际到位财政资金 245.00 万元，财政资金到位率 70%；自筹资金未到位；实际支付 245.00 万元，预算执行率 100%。

经项目组评价，庞泉沟村食用菌产业发展基地项目绩效评价总体评分为 86.4 分，评价结论为“良”。

项目主要经验及做法



（一）村民监督委员会监督+监理双重保障，筑牢项目实施根基

（二）“基地+农户”模式运营，拓宽增收渠道

（三）依托资源禀赋布局，聚焦产业提质增效

存在的问题

（一）项目总成本超预算

（二）自筹资金未到位

（三）经济效益指标——农户增收额 3000 元以上未达成

意见建议

（一）强化项目管控，严格控制项目成本

（二）完善资金保障机制

（三）制定阶段性目标，逐步向 3000 元靠拢



庞泉沟村食用菌产业发展基地项目绩效评价报告

晋荣和义信绩评〔2025〕9015号

一、基本情况

（一）项目背景

交城县庞泉沟村地处吕梁山脉东麓，生态环境优良，森林覆盖率高，具备发展食用菌产业的自然气候和资源优势。近年来，随着国家及省市各级政府对“三农”工作的高度重视和乡村振兴战略的深入实施，发展特色农业产业、促进农民持续增收成为推动乡村发展的关键路径。食用菌产业作为周期短、见效快、效益高、带动能力强的特色产业，符合绿色生态发展理念，市场前景广阔，是推动农业产业结构调整、实现产业兴旺的重要选择。

在此背景下，交城县立足本地资源禀赋和产业基础，为推动庞泉沟村及周边区域产业结构优化升级，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极谋划并实施了“庞泉沟村食用菌产业发展基地项目”。该项目旨在通过建设标准化、规模化、集约化的食用菌生产种植基地，引进优良菌种和先进种植技术，完善生产、加工、储藏、销售等产业链条，打造区域特色食用菌品牌。项目不仅着力于提升食用菌生产的科技含量和产业化水平，更致力于构建“基地+合作社+农户”的利益联结机制，有效带动当地及周边脱贫户、农户参与产业发展，实现稳定就业与增收，成为推动区域农业现代化、助力乡村产业振兴的重要举措。



该项目的实施，是交城县贯彻落实国家关于发展乡村特色产业、壮大县域经济决策部署的具体行动，也是培育乡村发展新动能、拓宽农民致富渠道的关键支撑，对促进当地农业提质增效、实现乡村可持续发展具有深远意义。

（二）项目立项

按照交城县乡村振兴局《关于开展 2024 年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库储备工作的通知》（交乡振发〔2023〕58 号）文件精神，交城县庞泉沟镇庞泉沟村村民委员会将该项目进行入库申报，并经交城县庞泉沟镇人民政府进行入库初审。

2024 年 9 月 14 日，交城县人民政府办公室发布《关于印发交城县 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金安排建设项目方案（调整）的通知》（交政办发〔2024〕25 号）文件，后附《交城县 2024 年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金安排建设项目表》，该表中公布了入库项目，该项目完成项目立项。

（三）项目资金

根据交城县庞泉沟镇庞泉沟村村民委员会编制的《交城县 2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目申报书》，该项目计划总投资 378.95 万元，其中申请财政资金 350 万元，村集体自筹 28.95 万元。

《交城县人民政府办公室关于印发交城县 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金安排建设项目方案（调整）的通知》（交政办发〔2024〕25 号）安排财政资金 245.00 万元。

（四）项目实施内容



该项目建设内容为：25 个 40 米食用菌大棚，其中种植棚 20 个、晾晒棚 5 个；土石方建设 41 亩，浆砌石护坡；建设水井房、水箱间、水电配套等基础设施。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过“庞泉沟村食用菌产业发展基地项目”的建设，拓宽农户产业增收渠道，实现家门口就业，激发村民脱贫致富的积极性，巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步推动乡村经济发展。

（二）项目年度目标

庞泉沟村食用菌产业发展基地项目建设完成：25 个 40 米食用菌大棚，其中种植棚 20 个、晾晒棚 5 个；土石方建设 41 亩，浆砌石护坡；建设水井房、水箱间、水电配套等基础设施。

三、绩效评价工作基本情况

（一）评价目的

通过对“庞泉沟村食用菌产业发展基地项目”的绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、项目管理情况、项目产出和效果达成情况等进行评价，了解资金使用是否达到预期目标，受益对象是否满意等方面，全面评价项目完成情况，绩效目标实现情况，总结项目经验，查找和分析项目存在的问题，提出合理、可行的意见建议。

（二）评价对象与范围

1. 评价对象

评价对象为庞泉沟村食用菌产业发展基地项目财政资金，计 245.00 万元。



2. 评价范围

绩效评价范围包括决策、过程、产出、效益四方面。

（三）评价依据

1. 财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；
2. 财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；
3. 财政部关于印发《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》的通知（财监〔2021〕4号）；
4. 交城县财政局关于印发《2025年度县级财政重点绩效评价实施方案》的通知（交财绩〔2025〕4号）
5. 业务约定书。

（四）评价原则

1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。
3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（五）评价方法



结合本次绩效评价项目的具体情况，评价工作组拟主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

1. 成本效益分析法

将本项目投入与产出、效益进行关联性分析，根据评分标准进行评价。

2. 比较法

将本项目实施情况与绩效目标情况进行比较，根据评分标准进行评价。

3. 因素分析法

综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4. 公众评判法

对本项目涉及的满意度等维度评价，评价组通过调查问卷以及现场座谈、访谈等方式进行评判，对项目执行情况进行打分，根据得分情况进行加权平均，计算本项目的评价结果。

（六）绩效评价指标体系

1. 指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合本项目特点和实际情况，细化设置了个性化评价指标，明确具体的评价标准，构建庞泉沟村食用菌产业发展基地项目绩效评价指标体系。绩效评价将指标分为决策、过程、产出和效果四个层次。



庞泉沟村食用菌产业发展基地项目具体包括 4 项一级指标、14 项二级指标、24 项三级指标的评价体系。具体如下表：

评价指标			目标值
一级指标	二级指标	三级指标	
决策（10）	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效目标明确性	合理
		目标匹配性	明确
	资金投入	资金测算科学性	科学
		资金分配合理性	合理
过程（25）	资金管理	资金到位率	100%
		预算执行率	100%
		资金使用合规性	合规
	项目管理	资金拨付及时性	及时
		制度建设完整性	完整
		建设过程监控有效性	有效
	绩效管理	绩效自评完成情况	真实、完整、合理、客观
产出（25）	产出数量	设施建设完成量	25 个大棚及附属设施
		菌棒投放量	60 万棒
	产出质量	设施质量达标率	100%
	产出时效	项目完成及时性	150 日历天%
	产出成本	总成本	小于 378.95 万元



	社会效益	产业规模提升度	增加
		就业带动人数	50 人以上
	经济效益	农户增收额	3000 元以上
	生态效益	菌糠回收率	≥80%
	可持续性	可持续运营	可持续
	满意度	受益群众满意度	≥95%

2. 评价标准

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号），结合本项目的实际情况，制定项目分值评级表，具体情况如下表：

分值范围	绩效级别
$100 > P \geq 90$	优
$90 > P \geq 80$	良
$80 > P \geq 60$	中
$P < 60$	差

（七）绩效评价工作过程

评价组在前期调研的基础上，完成了通知发放、收集和审核资料、现场核查、综合评价、内部会审、提交报告初稿、报告撰写、建立档案等，具体实施流程及内容如下：

1. 通知发放



由交城县财政局发放绩效评价通知，评价人员与交城县农业农村局、交城县庞泉沟镇庞泉沟村村民委员会沟通并发放应提供的资料清单等。

2. 收集、审核资料

评价组在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析。

3. 现场核查

评价组先后多次对交城县农业农村局、交城县庞泉沟镇庞泉沟村村民委员会提供的资料进行了审核，重点对提供的项目立项、实施资料等进行了比对复核。对项目负责人进行访谈，对受益对象开展社会调查，了解他们对相关政策的了解程度、资金的拨付情况、对项目的满意度等。

4. 综合评价

评价组根据确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。

5. 内部会审

形成绩效报告初稿前进行内部会审，审核并解决发现的报告中的问题，会审完毕后根据会审结论修改初稿。

6. 提交报告初稿

形成绩效评价报告初稿后，在征求交城县农业农村局、交城县庞泉沟镇庞泉沟村村民委员会意见后提交交城县财政局进行审核，根据审核意见和建议再次修改绩效评价报告。



7. 报告撰写

按要求撰写评价报告。报告包括以下主要内容：项目基本情况、项目绩效目标、绩效评价工作基本情况、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析、项目主要经验做法、存在的问题及原因分析，政策建议等。

8. 建立档案

以上步骤全部实施完成后，建立绩效评价项目档案，将项目涉及的资料全部装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）项目主要绩效产出

1. 完成项目建设情况

项目已完成建设 25 个 40 米食用菌大棚，其中种植棚 20 个、晾晒棚 5 个；土石方建设、浆砌石护坡；建设水井房、水箱间、水电配套等基础设施。

2. 满意度情况

通过对项目组人员以及受益群众进行问卷调查，项目整体满意度为 96%。

（二）项目整体结论

通过该项目决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，根据各项指标得分情况，庞泉沟村食用菌产业发展基地项目财政资金支出绩效评价总体得分为 86.4 分，综合绩效评价等级为“良”。

财政支出绩效评价一级指标得分情况



指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	10	25	25	40	100
分值	9	21.4	20	36	86.4
得分率	90%	85.6%	80%	90%	86.4%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入进行考察、分析评价。分值共计 10 分，本项目实际得分为 9 分，得分率 90%。各项考评指标得分情况如下表：

决策类指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2.00	2	100%
		立项程序规范性	规范	2.00	2	100%
	绩效目标	绩效目标明确性	合理	1.50	1.5	100%
		目标匹配性	明确	1.50	1.5	100%
	资金投入	资金测算科学性	科学	1.50	1	66.67%
		资金分配合理性	合理	1.50	1	66.67%

1. 项目立项

（1）立项依据充分性



党的二十大以来，党中央、国务院及省委、省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的安排部署，更多依靠发展来巩固拓展脱贫攻坚成果，支持联农带农富农产业发展。

2018 年以来，庞泉山珍白木耳已成为交城康养旅游的新名片，交城县庞泉沟镇庞泉沟村已建成吊袋木耳大棚 40 余个，年种植吊袋白木耳 46 万棒以上，直接带动短期就业 60 余人，已形成了较为成熟的吊袋白玉木耳产业。该项目的建设进一步扩大吊袋木耳生产力，符合地方发展规划、产业政策，得 1 分；

该项目的申报，由交城县庞泉沟村民委员会“党委会议”“村民代表大会”研究讨论通过，后经交城县庞泉沟镇人民政府审议通过，并公示。该项目的申报，对市场需求、资源条件、环境影响等进行深入分析，研究充分得 1 分；

依据评分标准，本指标共 2 分，得 2 分。

（2）立项程序规范性

交城县庞泉沟镇庞泉沟村村民委员会根据交城县乡村振兴局《关于开展 2024 年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库储备工作的通知》（交乡振发〔2023〕58 号）文件精神，进行了项目入库申报，并交城县庞泉沟镇人民政府进行入库初审。

2024 年 9 月 14 日，交城县人民政府办公室发布《关于印发交城县 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金安排建设项目方案（调整）的通知》（交政办发〔2024〕25 号）文件，后附《交城县 2024 年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金安排建设项目表》，该表中公布了入库项目，该项目完成项目立项。



2024 年 9 月 12 日，该项目在交城县行政审批服务管理局取得《山西省企业投资项目备案证》。

该项目按照规定的程序申请设立，得 1 分；所提交的文件、材料符合相关要求，经相关部门审批，得 1 分。

依据评分标准，本指标共 2 分，得 2 分。

2. 绩效目标

（1）绩效目标的合理性

交城县农业农村局提供了经审核的《项目绩效申报表》，得 0.5 分，《项目绩效申报表》中对绩效目标做了阐述，项目目标合理、具体，与《交城县 2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目申报书》中该项目申报情况相匹配，得 1 分。

依据评分标准，本指标共 1.5 分，得 1.5 分。

（2）绩效指标明确性

交城县农业农村局在《项目绩效申报表》中对庞泉沟村食用菌产业发展基地项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意指标进行了定量、定性阐述，得 1 分；绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得 0.5 分。

依据评分标准，本指标 1.5 分，得 1.5 分。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性



交城县庞泉沟镇庞泉沟村村民委员会 2024 年 9 月与山西晋宇工程造价咨询有限公司签订《建设工程造价咨询合同》，并出具《最高投标限价》报告，该报告根据项目建设内容做出预算，审定工程控制价为 3,589,036.69 元，该项目预算依据相关政策合理编制，预算内容清晰、合理，与工作任务相匹配，但该部分预算只包括建安工程部分，该项目实施未对前期费用进行预算编制，扣 0.5 分。

依据评分标准，本指标共 1.5 分，得 1 分。

(2) 资金分配合理性

庞泉沟村食用菌产业发展基地项目总预算为 378.95 万元，根据交城县庞泉沟镇庞泉沟村村民委员会提供的工程建设以及工程合同，资金分配情况如下：

费用类别	合同名称	承接方	合同金额（元）	占比（总概算）
前期费用	土地勘测定界合同	长平工程有限公司	19,357.98	0.51%
	设计合同	中晟勘察设计有限公司	82,598.00	2.18%
	建设工程造价咨询合同	山西晋宇工程造价咨询有限公司	13,961.53	0.37%
建安费用	建设工程施工合同	山西博悦天翔建筑工程有限公司	3,584,500.00	94.59%
待摊费用	建设工程监理合同	山西壬通建设监理有限公司	76,887.00	2.03%
	其他备用费用		12,195.49	0.32%
合 计			3,789,500.00	100.00%

通过以上分析，资金分配基本合理，但未提供上级审批资金分配相关资料，扣 0.5 分。

依据评分标准，本指标共 1.5 分，得 1 分。



（二）项目过程情况

过程类指标从资金管理、组织实施、绩效管理三个方面进行考察、分析评价。分值共计 25 分，本项目实际得分为 21.4 分，得分率 86%。各项考评指标得分情况如下表：

过程类指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	得分率
过程	资金管理	资金到位率	100%	4.00	1.4	35%
		预算执行率	100%	4.00	4	100%
		资金使用合规性	合规	3.00	3	100%
	项目管理	资金拨付及时性	及时	3.00	3	100%
		制度建设完整性	完整	3.00	3	100%
		建设过程监控有效性	有效	3.00	3	100%
	绩效管理	绩效自评完成情况	真实、完整、合理、客观	5.00	4	80%

1. 资金管理

（1）资金到位率

庞泉沟村食用菌产业发展基地项目概算 378.95 万元，其中自筹资金 28.95 万元，财政资金 350 万元。

庞泉沟村食用菌产业发展基地项目实际到位 245 万元，其中财政资金 245 万元。

通过访谈了解到，由于村集体资金薄弱，截至评价日，自筹资金到位 0.00 元。



$$\text{自筹资金资金到位率} = (\text{项目实际到位资金} / \text{项目预（概）算资金}) \times 100$$

$$= (0/20) \times 100\%$$

$$= 0\%$$

自筹资金到位分值共计 2 分，得分 0 分。

$$\text{财政资金到位率} = (\text{项目实际到位资金} / \text{项目预（概）算资金}) \times 100$$

$$= (245/350) \times 100\%$$

$$= 70\%$$

财政资金到位分值 2 分，得分 1.4 分。

依据评分标准，本指标共 4 分，得 1.4 分。

（2）预算执行率

通过查阅交城县农业农村局、交城县庞泉沟镇庞泉沟村村民委员会提供的财务资料，到位资金 245 万元已全部执行。

$$\text{预算执行率} = (\text{实际支出金额} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$$

$$= (245/245) \times 100\%$$

$$= 100\%$$

依据评分标准，本指标共 4 分，得 4 分。



（3）资金使用合规性

庞泉沟村食用菌产业发展基地项目财政资金（245 万元）基本走向为：交城县农业农村局填制《交城县预算单位财政直接支付申请书》并经审核后，通过国库集中支付将财政资金拨付给交城县庞泉沟镇庞泉沟村村民委员会，交城县庞泉沟镇庞泉沟村村民委员会收到财政资金后填制《交城县农村集体经济组织财务支出审批单》并经联签审核后支付给山西博悦天翔建筑工程有限公司、长平工程有限公司。

通过查阅交城县农业农村局、交城县庞泉沟镇庞泉沟村村民委员会提供的财务资料，会计资料 and 资金使用能够提供规定的相关材料，资金实际发生支出的会计核算信息完整，得 1 分；资金的拨付有完整的审批程序和手续且相关负责人全部签字，得 1 分；未发现资金挪用、侵占等得 1 分。

依据评分标准，本指标共 3 分，得 3 分。

2. 组织实施

（1）资金拨付及时性

通过查阅交城县农业农村局、交城县庞泉沟镇庞泉沟村村民委员会提供的财务资料，农业农村局、交城县庞泉沟镇庞泉沟村村民委员会均将到位资金及时拨付。

依据评分标准，本指标共 2 分，得 2 分。

（2）制度建设完整性

交城县庞泉沟镇庞泉沟村村民委员会建立了《庞泉沟村食用菌产业发展基地项目实施方案》《庞泉沟村食用菌产业发展基地



项目管理制度》，制度包括《前期筹备管理》《建设实施管理》《运营管理》《资金与档案管理》，制度建设完整。

依据评分标准，本指标共 3 分，得 3 分。

（3）建设过程监控有效性

根据交城县庞泉沟镇庞泉沟村村民委员会提供的招投标资料、施工合同、监理日志等资料，以及对项目负责人的访谈可知：在项目建设过程中，严格按照建设程序和遵守法律法规实施项目，从设计到施工，严格执行招标、投标，选择合格的设计、施工单位，实行工程监理+村民监督委员会监督制，加强项目管理，加大施工质量保障程度，对项目监控有效。

依据评分标准，本指标共 3 分，得 3 分。

3. 绩效管理

（1）绩效自评完成情况

根据《绩效自评表》《绩效自评报告》可知，交城县庞泉沟镇庞泉沟村村民委员会按照要求开展绩效自评工作，得 2 分。

在绩效自评报告中分析了项目经济效益、社会效益、改进措施与总结，并根据所设的绩效目标对项目产出数量、成本等指标进行分析；绩效自评打分为 96.4 分偏高，例如在时效指标中及时性未根据项目延期实际情况进行打分，未完全做到数据和内容全面、真实、准确，扣 1 分，得 2 分。

依据评分标准，本指标共 5 分，得 4 分。

（三）项目产出情况

过程类指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面进行考察、分析评价。分值共计 25 分，本项目实际得分为 20 分，



得分率 80%。各项考评指标得分情况如下表：

产出类指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	得分率
产出 (30)	产出数量	设施建设完成量	25 个大棚及附属设施	5.00	5	100%
		菌棒投放量	60 万棒	5.00	5	100%
	产出质量	设施质量达标率	100%	5.00	5	100%
	产出时效	项目完成及时性	150 日历天%	5.00	2	40%
	产出成本	总成本	小于 378.95 万元	5.00	3	60%

1. 产出数量

(1) 设施建设完成量

评价小组通过查看《竣工验收证明书》以及实地查看，庞泉沟村食用菌产业发展基地项目实际完成建设 25 个大棚及附属设施。

根据评分标准，本指标共 5 分，得 5 分。

(3) 菌棒投放量

根据《山西心言生物科技有限公司木耳三级菌种销售合同》，交城县庞泉沟镇庞泉沟村庞泉沟经济合作社于 2025 年 1 月 19 日向山西心言生物科技有限公司订购木耳三级菌种 60 万棒。

评价组通过查阅交城县庞泉沟镇庞泉沟村庞泉沟经济合作社与山西心言生物科技有限公司的订货打款银行回单，佐证了菌棒投放量为 60 万棒。

根据评分标准，本指标共 5 分，得 5 分。



2. 产出质量

(1) 设施质量达标率

根据《竣工验收证明书》，庞泉沟村食用菌产业发展基地项目于 2025 年 5 月 31 日由交城县庞泉沟镇庞泉沟村村民委员会（建设单位）、山西壬通建设监理有限公司（监理单位）、中滕勘察设计有限公司（设计单位）、山西博悦天翔建筑工程有限公司（施工单位）联合验收合格。

根据评分标准，本指标共 5 分，得 5 分。

3. 产出时效

(1) 项目完成及时性

《建设工程施工合同》约定：合同工期共计 150 日历天。

根据《竣工报告》，庞泉沟村食用菌产业发展基地项目实际开竣工日期为 2024 年 9 月 14 日至 2025 年 5 月 31 日，远超计划工期 150 天，经了解在施工过程中由于冬季上冻等原因，经双方协商，工期后延。

根据评分标准，本指标共 5 分，得 2 分。

4. 产出成本

(1) 总成本

庞泉沟村食用菌产业发展基地项目评价期间仍未进行项目竣工财务决算。

该项目在交城县行政审批服务管理局备案的项目总投资 378.95 万元。



建设工程结算审定结算价：3,625,290.32 元；待摊费用按照合同价计算，包括勘测费 19,357.98 元、建设工程造价咨询费（最高控制价）审核费 13,961.53 元、设计费 82,598.00 元、监理费 76,887.00 元，合计 192,804.51 元。

项目实际总投资 381,809483 万元，较备案立项项目总投资 378.95 万元，超预算 2.859483 万元。

根据评分标准，本指标共 5 分，得 3 分。

（四）项目效益情况

效益类指标从社会效益、经济效益、可持续影响、满意度四方面进行考察、分析评价。分值共计 40 分，本项目实际得分为 36 分，得分率 90%。各项考评指标得分情况如下表：

效益类指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分	得分率
	社会效益	产业规模提升度	增加	6.00	5	83.3%
		就业带动人数	50 人以上	6.00	6	100%
	经济效益	农户增收额	3000 元以上	6.00	4	66.67%
	生态效益	菌糠回收率	≥80%	6.00	5	83.3%
	可持续性	可持续运营	可持续	6.00	6	100%
	满意度	受益群众满意度	≥95%	10.00	10	100%

1. 社会效益

（1）产业规模提升度

根据交城县农业农村局《交城县 2023—2025 年吊袋木耳发展情况统计》，交城县 2025 年发展数量为 280.354 万棒，庞泉沟村



食用菌产业发展基地项目发展菌棒数量 60 万棒，占比 21.4%，对产业规模提升度有一定影响。

根据评分标准，本指标共 6 分，得 5 分。

（2）就业带动人数

根据庞泉沟镇庞泉沟村庞泉沟经济合作社提供的《庞泉沟组麻叶则大棚 4 月 1 日至 8 月 10 日务工信息表》，在 2025 年大棚种植期间，共有超过 125 人次在此务工。

根据评分标准，本指标共 6 分，得 6 分。

2. 经济效益

（1）农户增收额

根据庞泉沟镇庞泉沟村庞泉沟经济合作社提供的《庞泉沟组麻叶则大棚 4 月 1 日至 8 月 10 日务工信息表》，在 2025 年大棚种植期间，共发放劳务报酬 228,826.00 元，农户增收，但未达人均增收 3000 元以上。

根据评分标准，本指标共 6 分，得 4 分。

3. 生态效益

（1）菌糠回收率

根据问卷调查以及对负责人相关访谈，在吊袋木耳种植完成后，由于菌糠含量主要为木屑、剩余废弃菌料，一部分菌糠由附近居住村民自行搬运回家，或当作冬季取暖材料，减少了传统村民捡柴的不便，或添加在饲料中，减少养殖成本；另一部分菌糠由合作社简单处理后改善大棚及周边土壤环境，菌糠回收率高达



90%以上，未对周边环境造成危害，但该部分数据仅为问卷调查以及访谈，未有资料佐证，扣 1 分。

根据评分标准，本指标共 6 分，得 5 分。

4. 可持续性影响

（1）可持续运营

庞泉沟村食用菌产业发展基地建设完成后，大棚寿命可达 10 年以上，具备基础运营条件，并由庞沟镇庞泉沟村庞泉沟经济合作社采用“基地+农户”机制进行运营。

根据评分标准，本指标共 6 分，得 6 分。

4. 满意度

根据问卷调查的结果，该项目综合满意度为 96%，大于 95%，该项指标得 10 分。

根据评分标准，本指标共 10 分，得 10 分。

六、项目主要经验及做法

（一）村民监督委员会监督+监理双重保障，筑牢项目实施根基

项目实施过程中，通过村民监督委员会监督工作机制衔接各方资源，同时严格执行工程监理制，从设计、施工到验收全程把控质量。严格遵守招投标程序，选择合格的设计、施工单位，强化建设过程监控，确保项目建设规范有序推进。

（二）“基地+农户”模式运营，拓宽增收渠道



采用“基地+农户”模式，通过大棚租赁降低农户经营风险，合作社为承包农户提供技术指导、市场对接等服务，提升农户可持续发展能力。项目直接带动大量村民务工就业，形成稳定的利益联结机制，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。

（三）依托资源禀赋布局，聚焦产业提质增效

立足庞泉沟村优良生态环境和现有木耳产业基础，扩大种植规模、完善产业链条，新增 60 万棒菌棒种植能力，推动区域食用菌产业规模化、集约化发展，提升产业整体竞争力。

七、存在的问题及原因分析

（一）项目总成本超预算

项目实际总投资 381,809483 万元，较备案立项项目总投资 378.95 万元，超预算 2.859483 万元。

（二）自筹资金未到位

截至绩效评价报告日，项目自筹资金未按计划到位。

（三）经济效益指标——农户增收额 3000 元以上未达成

在 2025 年大棚种植期间，共带动农户 125 人以上务工，发放劳务报酬 228,826.00 元，人均增收 1830.60 元，农户人均增收未达到 3000 元以上的目标。

八、意见建议

（一）加强项目预算管控，严格控制项目成本

加强项目前期可行性研究和设计，科学制定项目预算，避免成本超支。



（二）完善资金保障机制

建立自筹资金专项落实方案，通过多元化渠道筹措资金，确保资金足额到位。

（三）制定阶段性目标，逐步向 3000 元靠拢

为切实推动农户人均增收，逐步向 3000 元目标靠拢，建议项目实施单位应当制定阶段性目标，可通过优先聘用贫困户、聘用部分固定人员、从岗位拓展、薪资优化等方面进行着手。

九、附件

附件 1 绩效评价指标体系

附件 2 合规性检查报告

附件 3 访谈报告

附件 4 满意度调查问卷

附件 5 满意度调查问卷统计

评价机构：山西荣和义信会计师事务所

2025 年 11 月 10 日



附件 1 绩效评价指标体系

评价指标				目标值	指标解释	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
决策（10）	项目立项	立项依据充分性	2.00	充分	项目立项是否符合乡村产业振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果等政策要求，是否有明确文件依据	①项目是否符合国家及地方发展规划、产业政策等相关要求，符合得 1 分，基本符合得 0.5 分，不符合得 0 分。 ②项目立项前是否开展充分的可行性研究，对市场需求、资源条件、环境影响等进行深入分析，研究充分得 1 分，较充分得 0.5 分，不充分得 0 分。
		立项程序规范性	2.00	规范	项目是否履行可行性研究、专家论证、审批等法定程序	①项目按照规定的程序申请设立，得 1 分，否则不得分；②所提交的文件、材料符合相关要求，经相关部门审批，得 1 分，否则不得分。
	绩效目标	绩效目标明确性	1.50	合理	项目是否设定清晰、可量化的产出及效益目标（如菌棚面积、带动就业人数等）	①提供经审核的《绩效申报表》得 0.5 分，②项目目标是否合理、具体，是否与发展需求相匹配，目标明确具体且匹配得 1 分。
		目标匹配性	1.50	明确	绩效目标是否与财政资金投入规模、当地产业发展需求相匹配	①绩效指标能够在产出的数量、质量、成本、时效等方面进行细化，做到定量表述，得 1 分；②绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得 0.5 分。
	资金投入	资金测算科学性	1.50	科学	财政资金预算测算是否基于项目建设内容，测算依据是否充分	①预算依据相关政策合理编制，得 1 分；②预算内容清晰、合理，与工作任务相匹配，得 0.5 分；
		资金分配合理性	1.50	合理	资金在设施建设、设备购置、技术推广等环节的分配是否符合项目实施需求	该项分值为 1.5 分，预算资金分配合理得 1 分，具备相关审批或申报材料，得 0.5 分；



过程 (25)	资金管理	资金到位率	4.00	100%	实际到位财政资金占计划到位资金的比例, 计算公式: (实际到位金额 / 计划到位金额) × 100%	该项分值为 4 分, 资金到位率分为自筹资金与财政资金, 分别计算, 其中自筹资金 2 分、财政资金 2 分。资金到位率达计划值, 得 2 分, 否则为实际资金到位率*权重分
		预算执行率	4.00	100%	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率= (实际支出金额/实际到位资金) × 100%。	该项分值为 4 分, 预算执行率达计划值, 得 4 分, 否则为实际预算执行率*权重分
		资金使用合规性	3.00	合规	资金是否按规定用途使用, 有无截留、挤占、挪用等情况, 会计核算是否规范	该项分值为 3 分, ①会计资料和资金使用能够提供规定的相关材料, 资金实际发生支出的会计核算信息完整得 1 分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续且相关负责人全部签字, 得 1 分; ③未发现资金挪用、侵占等得 1 分。
	项目管理	资金拨付及时性	3.00	及时	财政资金是否按项目实施进度及时拨付至实施单位	资金拨付及时给付承接项目。
		制度建设完整性	3.00	完整	是否建立项目实施管理、质量控制、安全生产等相关制度	项目建设制度是否完整, 完整得 3 分, 实施、质量控制、安全生产缺一项扣 1 分。
		建设过程监控有效性	3.00	有效	是否开展项目进度跟踪、质量检查, 对发现问题是否及时整改	在项目建设工程中, 有切实可靠可行的监控体系, 得 3 分; 没有则不得分。
	绩效管理	绩效自评完成情况	5.00	真实、完整、合理、客观	考核项目实施单位是否组织开展绩效自评工作, 自评内容是否真实、完整、客观、公正, 用以反映和考核项目实施单位的绩效自评完成情况。	①按 要求开展绩效自评工作, 得 2 分; ② 绩效自评报告完整, 数据和内容全面、真实、准确, 绩效指标细化量化, 科学合理, 绩效自评反映的问题具体, 意见可行, 得 3 分;



产出 (25)	产出数量	设施建设完成量	5.00	25 个 大棚及 附属设 施	包括新建大棚数量等实际完成值	根据申报表，建成 20 个 40 米的种植大棚、5 个 40 米的晾晒棚、配套附属设施包括水井房、水箱间、水电配套等；全部完成建设得 5 分，未完成 1 项扣 1 分。
		菌棒投放量	5.00	60 万 棒	是否达到 60 万棒的种植规模	根据种植大棚是否可以种植 60 万菌棒得分，建设完成的大棚能够承载 60 万菌棒的种植条件得 5 分，未达到种植标准不得分。
	产出质量	设施质量达标率	5.00	100%	项目设施建设是否质量全部达标	验收合格得 5 分；验收不合格部分整改后验收合格得 3 分；验收不合格不得分。
	产出时效	项目完成及时性	5.00	150 日 历天%	项目是否在计划期限内完成全部建设内容	按规定时间完成建设得 5 分；未按时完成但有合理说明得 2 分；未按时完成且无说明得 0 分。
	产出成本	总成本	5.00	小于 378.95 万元	主要考察项目建设的成本	被评价单位提供竣工财务决算的，项目总成本小于 378.95 万元，得 5 分；超预算，小于 378.95 万元的 10%，得 3 分，大于 378.95 万元的 10%，不得分。
	社会效益	产业规模提升度	6	增加	项目实施后在当地食用菌年产量中占比是否有影响。	产业规模提升度应综合评分。
		就业带动人数	6	50 人 以上	项目通过直接就业、间接就业带动的总人数，重点统计脱贫户就业人数	根据运营台账评分，就业带动人数达 50 人以上得 4 分，未达到 50 人的按照权重给分。
	经济效益	农户增收额	6	3000 元 以上	考察项目建设带来的农民增收额。	①带动经济收入增长得 3 分；②农户增收额达 3000 元再得 2 分；③有相关佐证资料得 1 分③未产生经济效益不得分。
	生态效益	菌糠回收率	6	≥80%	项目回收利用的菌糠数量占总产生量的比例	结合实地走访、访谈、问卷调查，了解种植菌糠回收方式，以及菌糠回收率，评估对生态效益的影响，综合给分。



	可持续性	可持续运营	6	可持续	考察项目是否可持续运营	综合问卷以及相关资料评估运营机制是否可持续性，使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展得满分，可根据其他情况综合评分。
	满意度	受益群众满意度	10.00	≥95%	大棚种植户、受益农户等对项目实施效果的满意程度	通过调查问卷情况，满意度≥95%，得 10 分，其余情况得分=权重分*了解程度。



附件 2 合规性检查报告

为保证庞泉沟村食用菌产业发展基地项目的项目管理、财务核算监督、制度执行等方面的规范性，特制定合规性检查方案，对交城县庞泉沟镇庞泉沟村村民委员会财政资金支出的使用及实施管理开展合规性检查。

一、合规性检查对象

本次检查对象为纳入本次绩效评价的财政资金 245.00 万元。

二、合规性检查内容

本次合规性检查内容包括资金使用、项目管理、财务核算监督、制度执行等，目的在于深入了解实施部门对“庞泉沟村食用菌产业发展基地项目”开展情况，以发现管理层面和实施操作规范性上存在的问题，内容如下：

1. 资金管理

包括是否制定或具有相应的项目资金管理办法及是否符合相关财务会计制度的规定。

2. 资金使用

包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续及符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；



3. 财务核算监督

包括是否已制定或具有相应的核算办法和监督机制，采取了相应的财务检查等必要的监督措施或手段。

4. 项目管理

包括是否已制定或具有相应的业务管理制度及合法、合规、完整性。

5. 制度执行

包括是否遵守相关法律法规、业务管理和财务制度规定，业务考核记录及财务支出手续是否完备等。

三、合规性检查方法

本次合规性检查通过现场核查的方式开展，现场核实核查对象提供的资料。

四、合规性检查情况

（一）资金使用情况

评价组对纳入本次绩效评价的项目支出 245.00 万元财政资金支出进行核查，通过核查相关会计资料 and 各项经费使用能够提供规定的相关材料，资金实际发生支出的会计核算信息完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续（且相关负责人全部签字），经费在各级的支出手续完整，经审核通过后申请拨付资金；未发现套取、截留、挤占、挪用等情况。



（二）财务核算监督情况

该项目财政资金由交城县农业农村局拨付至交城县庞泉沟镇庞泉沟村村民委员会，由庞泉沟村村民委员会联签审核后根据项目进度、合同支付给承包单位、监理单位等。

（三）项目管理情况

被评价单位在项目建设过程中采用项目监理制度，项目管理基本规范。

五、检查结论

本次合规性检查通过深入了解实施部门对财务核算管理、项目管理、监督工作开展情况，整体在业务管理层面和实施操作规范性上较为规范。



附件 3 访谈报告

访谈地点：山西荣和义信会计师事务所（普通合伙）办公室

一、访谈目的

本次访谈旨在通过对交城县庞泉沟镇庞泉沟村村民委员会项目负责人的访谈，了解和评估庞泉沟村食用菌产业发展基地项目财政资金支出的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为更好地使用财政资金项目工作建言献策。

二、访谈对象

实施单位：交城县庞泉沟镇庞泉沟村村民委员会书记康继宏

三、访谈内容

1. 评价组问：请简单介绍项目概况。

庞泉沟村食用菌产业发展基地项目是进一步扩大庞泉沟木耳产业基地种植实施的一个项目，我们已在庞泉沟村阳坡组建成一个种植基地，这个项目的建设，进一步扩大了产值，带动了农户收入。该项目建设 25 个大棚，其中 20 个种植棚，5 个晾晒棚，建成种植规模可达到 60 万棒。

2. 评价组问：请您介绍一下项目资金的来源、资金拨付流程及资金支出情况。

该项目资金来源包括财政资金和自筹资金，财政资金为巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴统筹资金，计划 350 万元，已到位 245 万元。

庞泉沟村食用菌产业发展基地项目财政资金（245 万元）基本走向为：交城县农业农村局填制《交城县预算单位财政直接支



付申请书》并经审核后，通过国库集中支付将财政资金拨付给交城县庞泉沟镇庞泉沟村村民委员会，交城县庞泉沟镇庞泉沟村村民委员会收到财政资金后填制《交城县农村集体经济组织财务支出审批单》并经联签审核后支付给山西博悦天翔建筑工程有限公司、长平工程有限公司。

目前，245 万元已全部支付完成。

3. 评价组问：请简要介绍制定或执行的管理制度等，在项目完工后，有哪些制度可以保障项目可持续发展？

项目实施过程中建立了健全、合理的制度。

在项目完工后，我们将继续鼓励村民承包种植大棚，继续采用基地+农户的运营模式。

4. 评价组问：在项目实施过程中，贵司如何保障项目有序推进？

项目实施过程中，我单位主要采用项目监理制加干部驻村负责制。

5. 评价组问：项目运营情况如何，是否达到预期目标效益？大棚预期使用年限为多长？

目前，项目运营良好，该项目建设大棚预计使用寿命为 10 年以上，2025 年上架 60 万菌棒，达到预期菌棒量，销售也进入尾声。

6. 评价组问：请您谈谈现阶段遇到的主要困难和问题，以及有何改进建议。



白玉木耳整体市场售价小于前几年，我们在积极地探寻销路。建议相关部门加大技术指导，加大农业补贴力度，减少农民种植成本。



附件 4 庞泉沟村食用菌产业发展基地项目调查问卷

“庞泉沟村食用菌产业发展基地项目”

群众满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！我所受交城县财政局的委托，为了真实客观反映“庞泉沟村食用菌产业发展基地项目”实施取得的效果，客观公正地评价财政资金的绩效，我们组织了这次问卷调查。本问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。您所提供的信息将是本次满意度评价的重要依据。问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息也将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

山西荣和义信会计师事务所（普通合伙）

2025 年 11 月

一、基本问题

1. 您的身份：

- A. 承包户 B. 附近村民 C. 贫困户

2. 您是否了解“庞泉沟村食用菌产业发展基地项目”：

- A. 非常了解 B. 比较了解 C. 不太了解 D. 完全不了解

3. 您通过何种渠道了解到冯家沟村文旅项目：

- A. 曾务工 B. 从没有

4. 您认为该项目是否提高您的收入：

- A. 没有提高
- B. 提高了，1000 元以上 3000 元以下



C. 提高了, 3000 元以上

5. 大概有多少人和您曾一起务工:

A. 小于 20 人

B. 20~50 人

C. 50 人以上

6. 剩余菌糠是否对您的生活环境造成影响:

A. 污染环境, 造成不便

B. 可以当柴火烧, 省了不少事

C. 没有什么影响

7. 总体而言, 您对庞泉沟村食用菌产业发展基地项目的满意度:

A. 非常满意

B. 满意

C. 一般

D. 不满意

E. 非常不满意

8. 对于未来类似项目的开展, 您有哪些建议?

再次感谢您的参与和支持!



附件 5 满意度调查报告

一、调查背景

庞泉沟村食用菌产业发展基地项目已完工，为调查项目受益人群对该项目的满意度，我们对项目人员、项目周边农民等开展了随机问卷调查。

二、调查目的

根据问卷调查结果，通过数据分析统计满意度分值。

三、满意度情况分析

（一）回收有效问卷情况

本次现场调查采取微信小程序“问卷星”，收回有效问卷 41 份。

（二）调查问卷基本情况及满意度统计

调查问卷基本情况统计如下图：

庞泉沟村食用菌产业发展基地项目满意度调查问卷

第 1 题 您的身份： [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
承包户	12	29.27%
附近村民	27	65.85%
贫困户	2	4.88%
本题有效填写人次	41	

第 2 题 您是否了解庞泉沟食用菌产业发展基地项目 [\[单选题\]](#)



选项	小计	比例
非常了解	31	<div><div></div></div> 75.61%
比较了解	7	<div><div></div></div> 17.07%
不太了解	3	<div><div></div></div> 7.32%
完全不了解	0	<div><div></div></div> 0%
本题有效填写人次	41	

第 3 题 您是否曾在该基地务工？ [多选题]

选项	小计	比例
曾务工	40	<div><div></div></div> 97.56%
从没有	1	<div><div></div></div> 2.44%
本题有效填写人次	41	

第 4 题 您认为该项目是否提高您的收入 [单选题]

选项	小计	比例
没有提高	1	<div><div></div></div> 2.44%
提高了，1000 元以上 3000 元以下	11	<div><div></div></div> 26.83%
提高了，3000 元以上	29	<div><div></div></div> 70.73%
本题有效填写人次	41	

第 5 题 大概有多少人和您曾一起务工 [单选题]




选项	小计	比例
小于 20 人	0	<div><div></div></div> 0%
20 ~ 50 人	12	<div><div></div></div> 29.27%
50 人以上	29	<div><div></div></div> 70.73%
本题有效填写人次	41	

第 6 题 剩余菌糠是否对您的生活环境造成影响 [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
污染环境，造成不便	0	<div><div></div></div> 0%
可以当柴火烧，省了不少事	35	<div><div></div></div> 85.37%
没有什么影响	6	<div><div></div></div> 14.63%
本题有效填写人次	41	

第 7 题 您对该项目的总体满意度如何？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
非常满意	36	<div><div></div></div> 87.8%
满意	3	<div><div></div></div> 7.32%
一般	1	<div><div></div></div> 2.44%
不满意	0	<div><div></div></div> 0%
非常不满意	1	<div><div></div></div> 2.44%
本题有效填写人次	41	

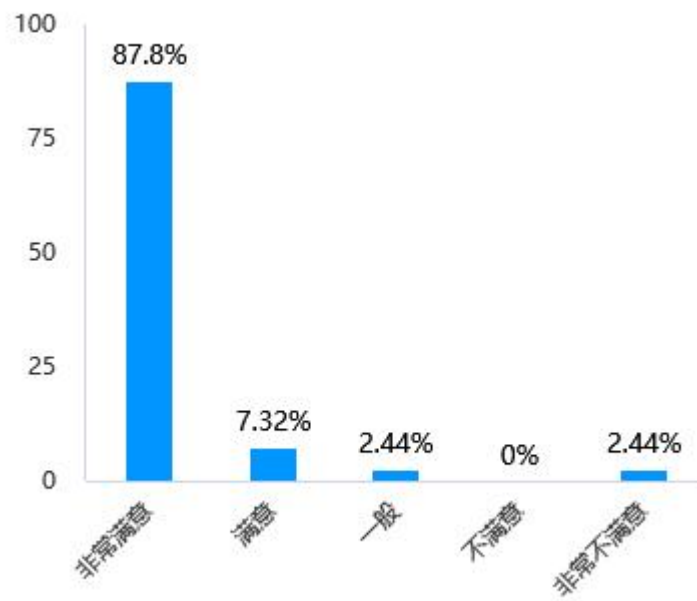

第 8 题 对于未来类似项目的开展，您有哪些建议？ [填空题]

无

四、总结

根据问卷调查的结果，综合分析，该项目满意度为 96%，即受访者对该项目总体满意。
